



# Hovedfremdriftsplan 20743 Brannstasjonen


utskrift: fr 10.07.15




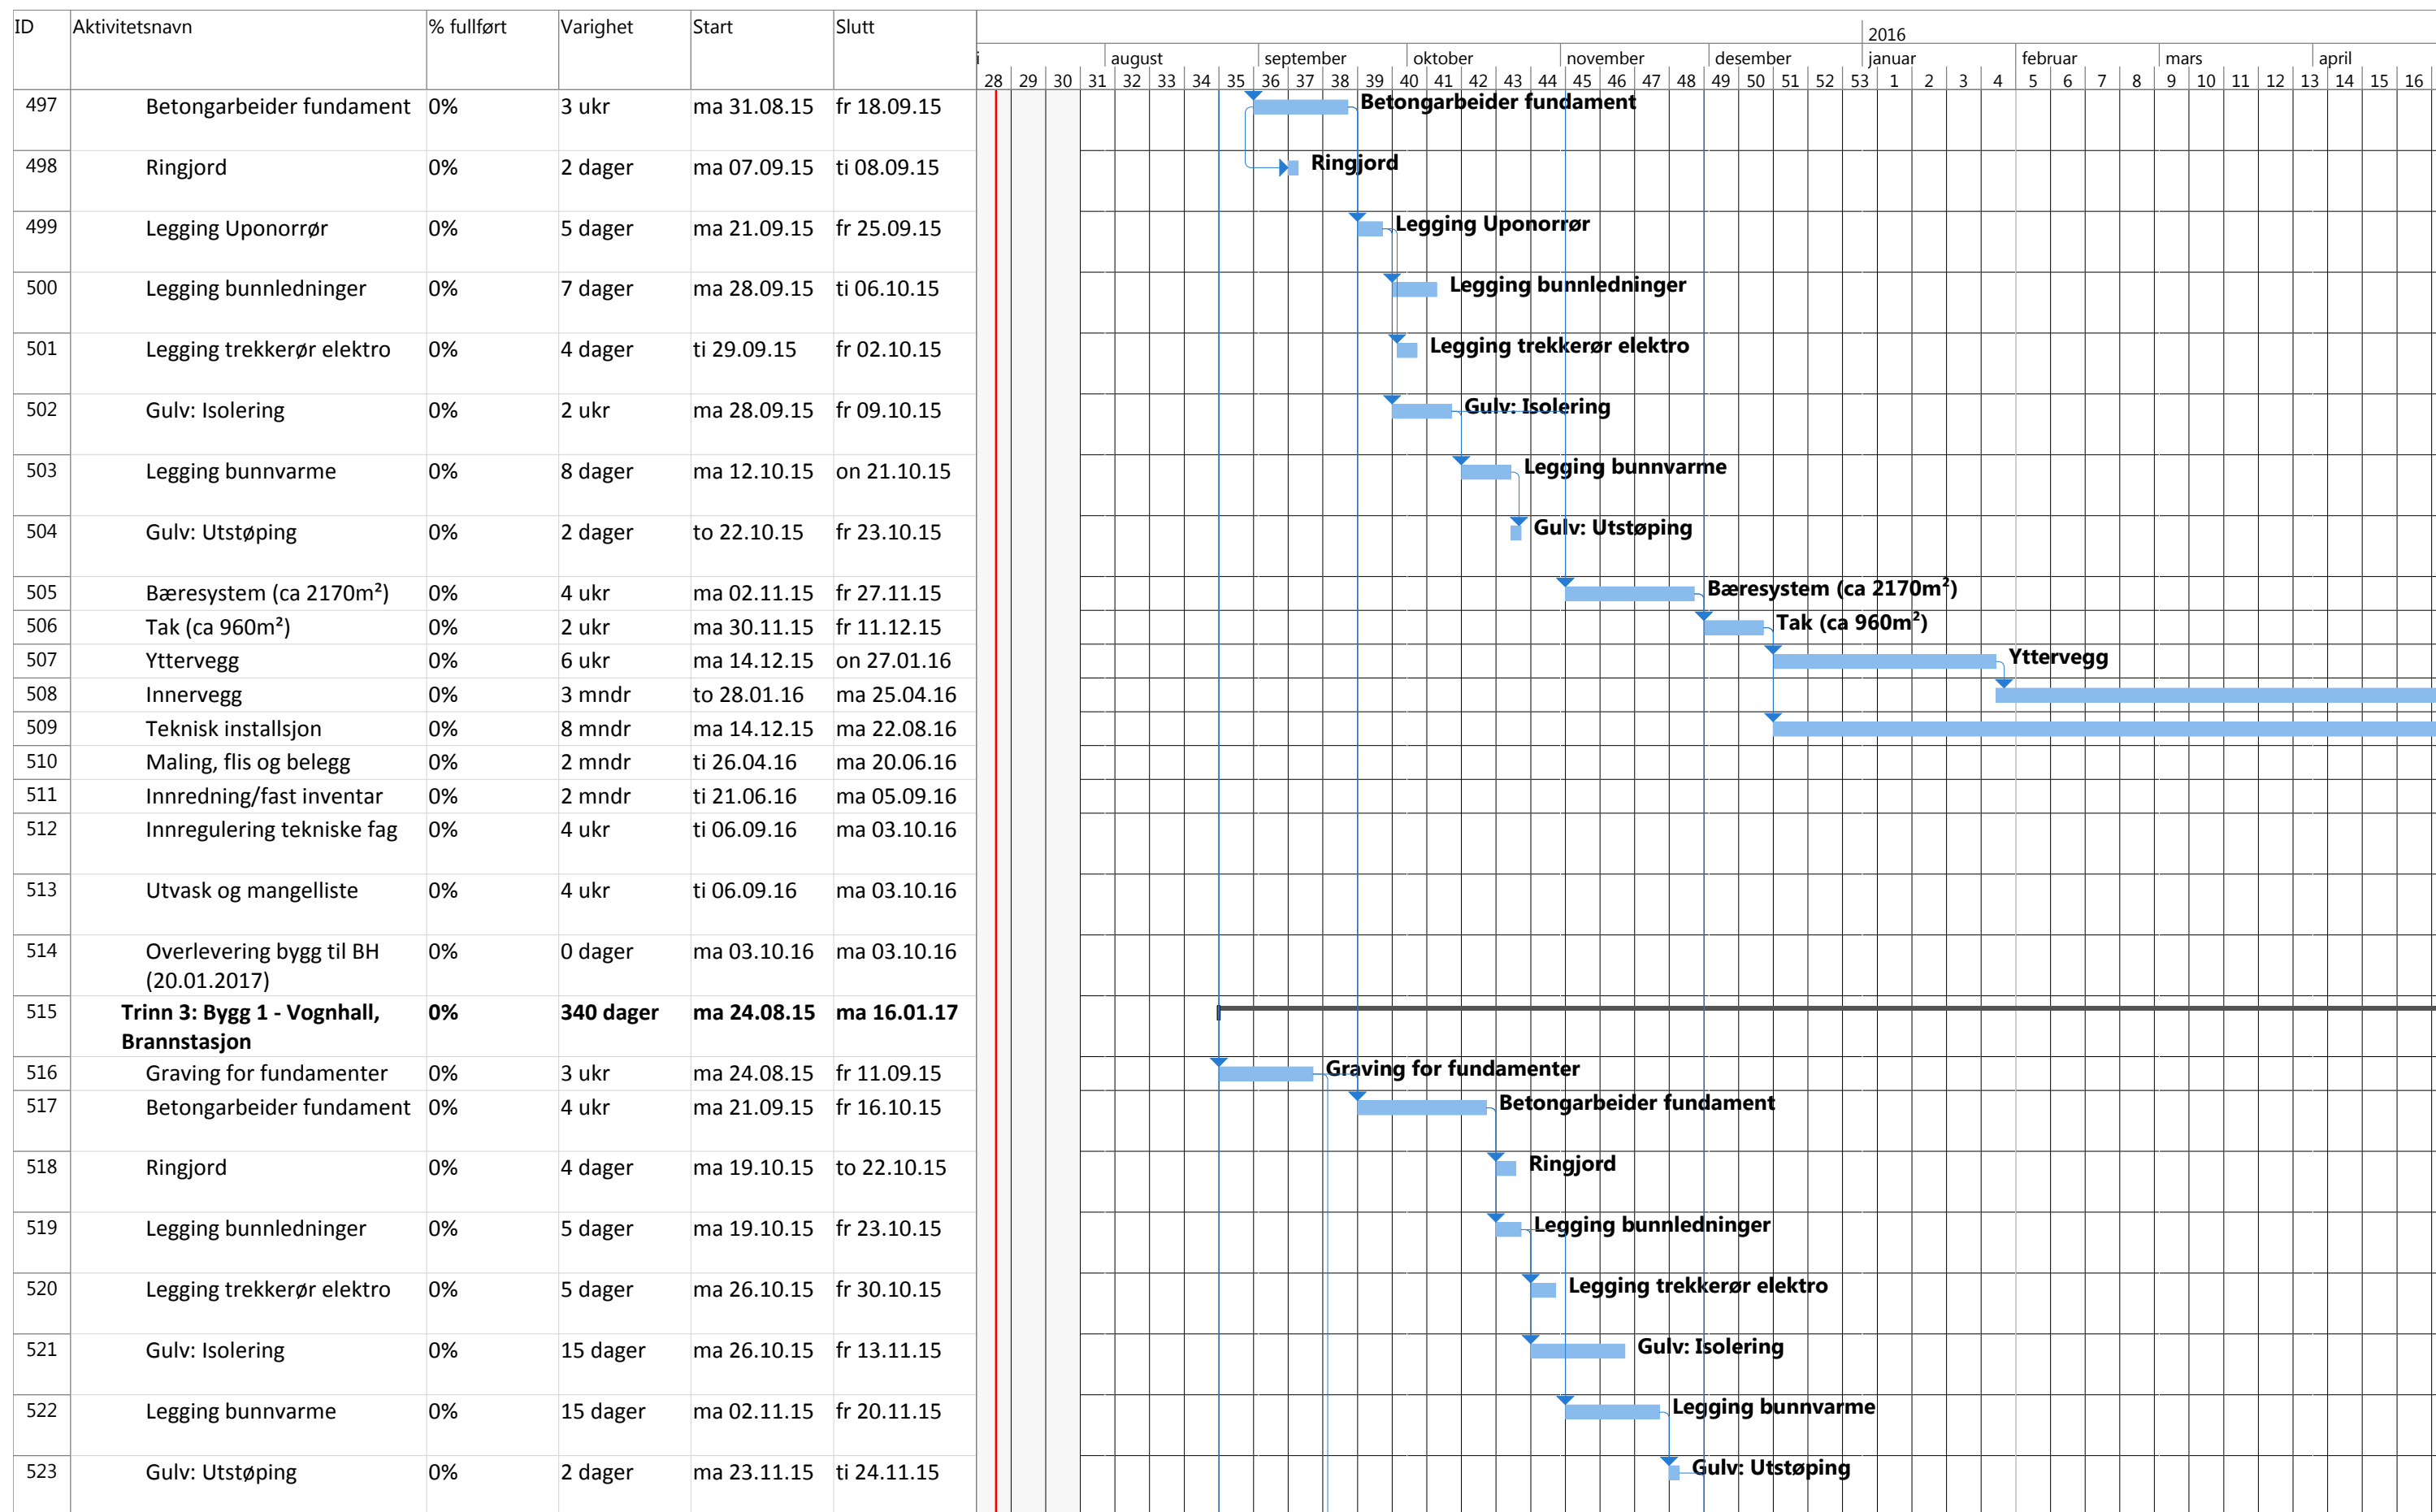

# Hovedfremdriftsplan 20743 Brannstasjonen


utskrift: fr 10.07.15



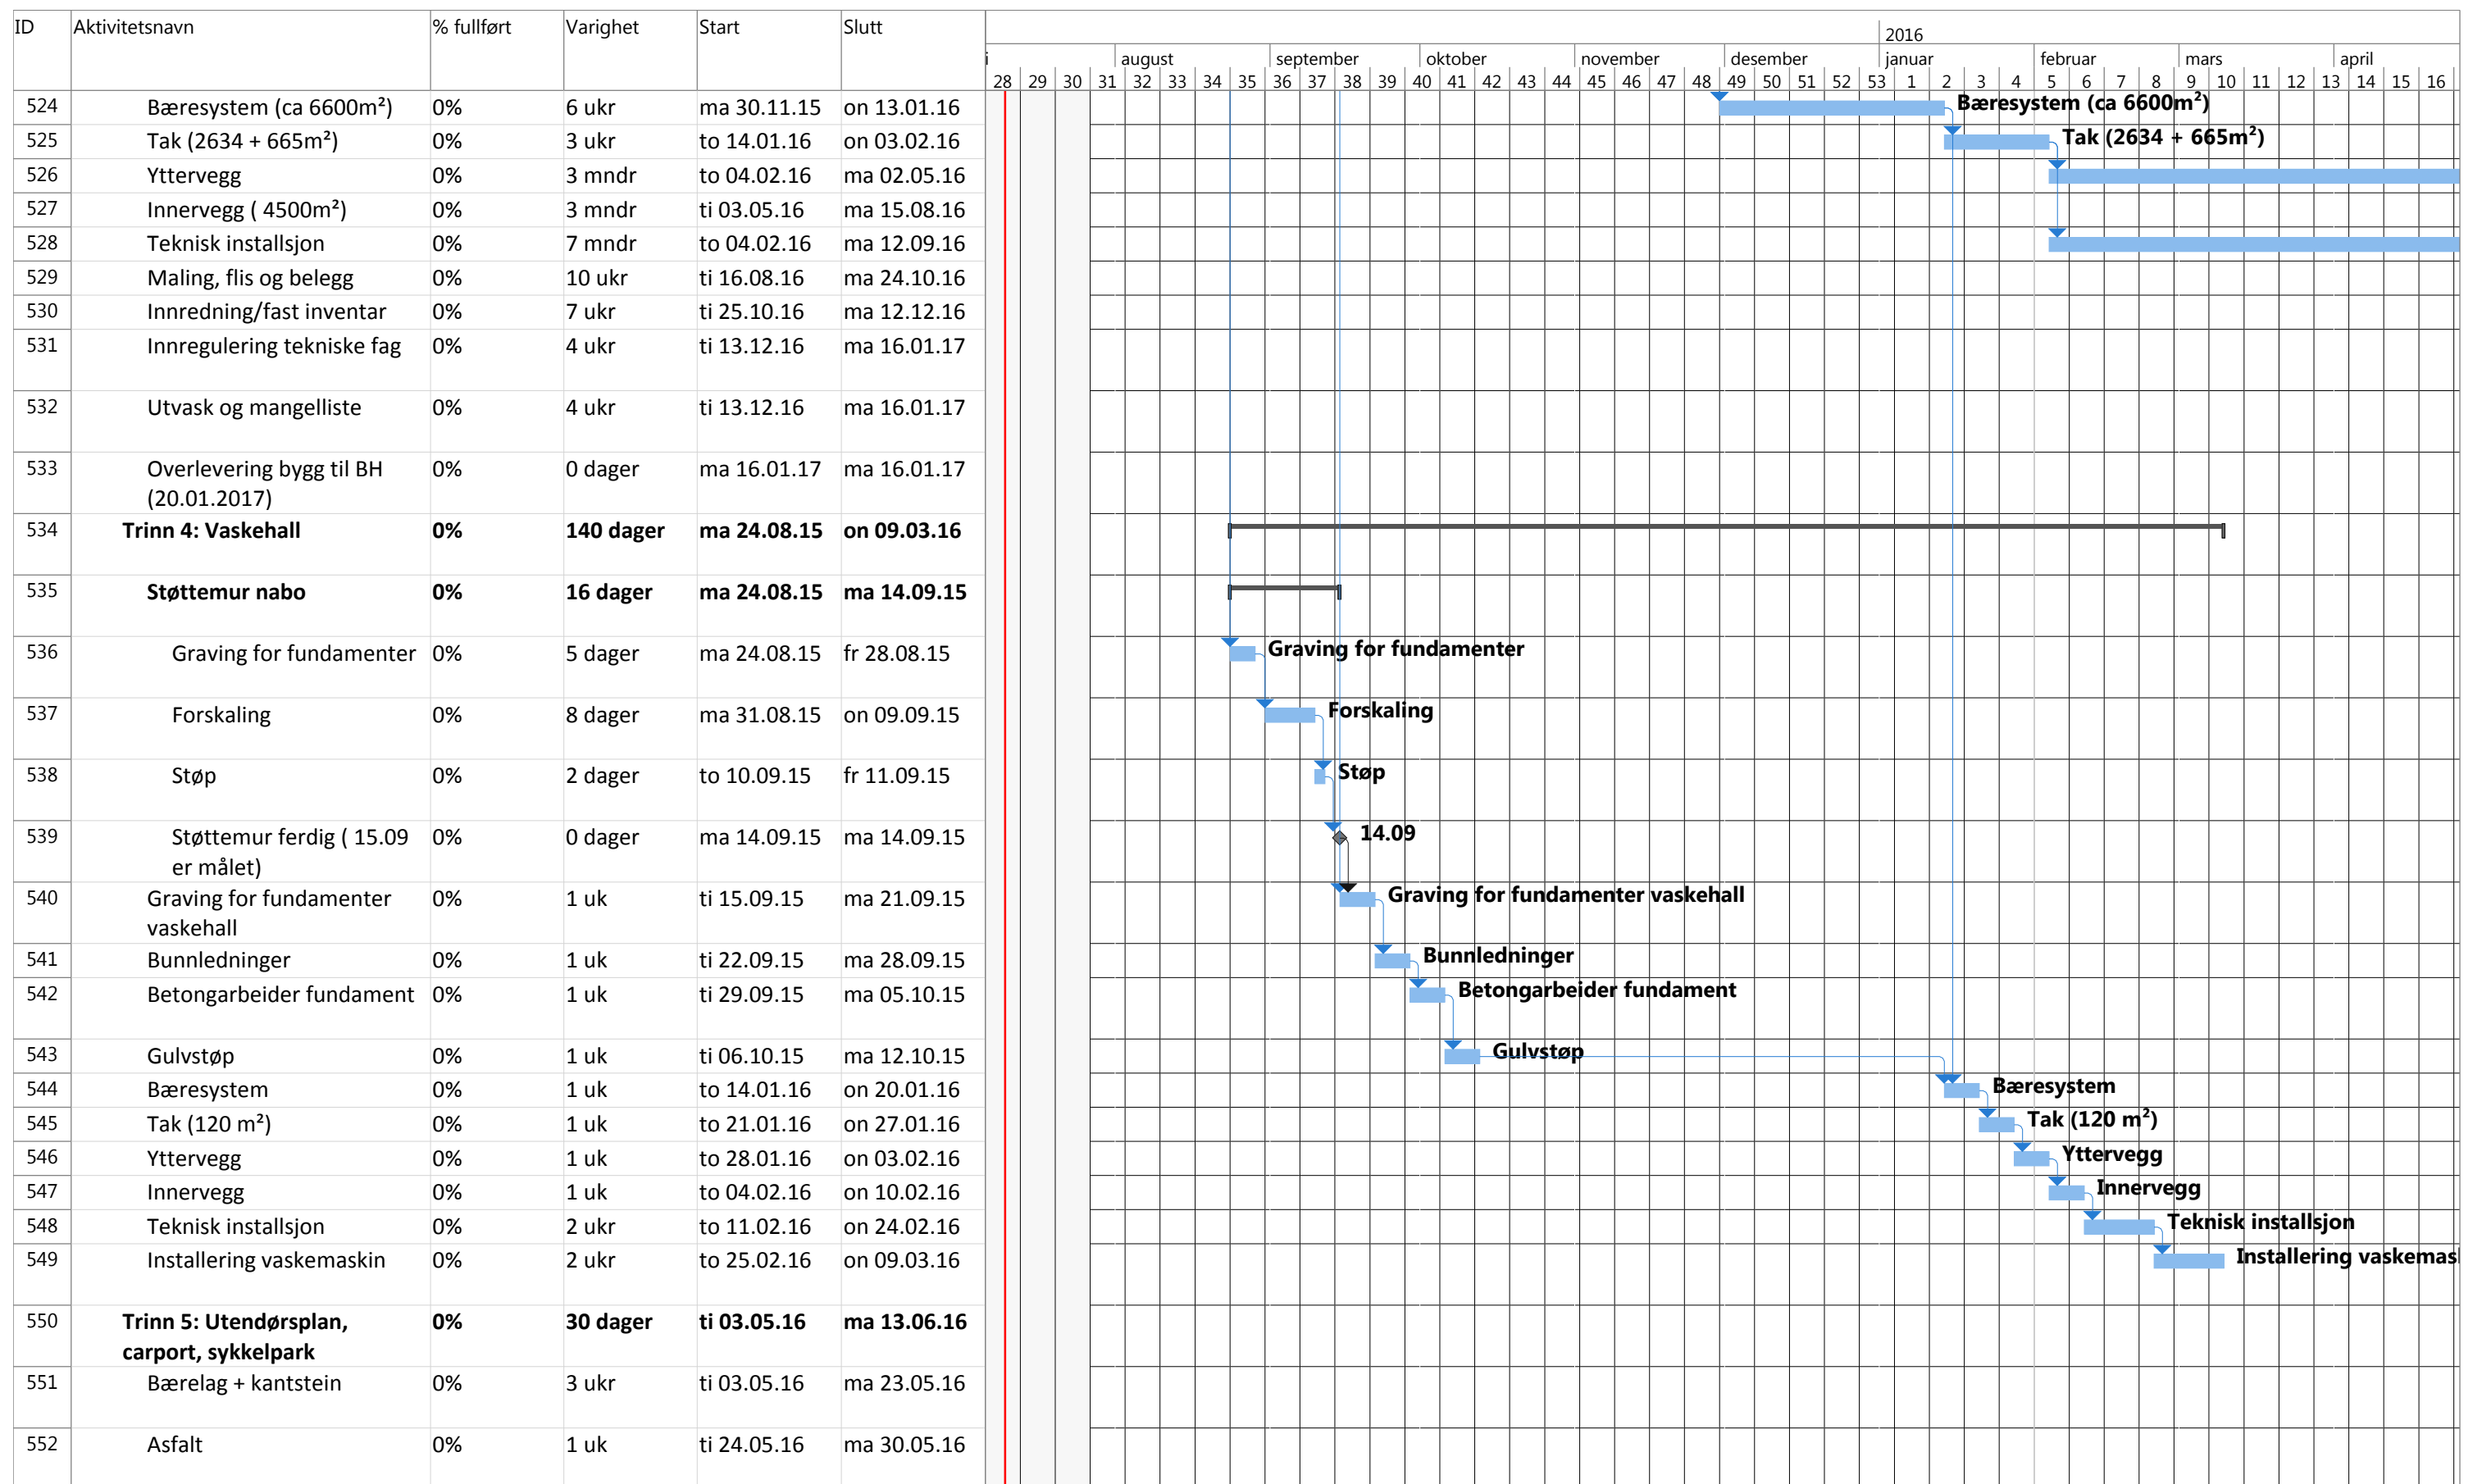

# Hovedfremdriftsplan 20743 Brannstasjonen

utskrift: fr 10.07.15







ID	Aktivitetsnavn	% fullført	Varighet	Start	Slutt	2017																																																					
						mai						juni						juli						august						september						oktober						november						desember						2017					
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6												
469	<b>Byggefase</b>	<b>3%</b>	<b>399 dager</b>	<b>ma 18.05.15</b>	<b>fr 20.01.17</b>	[Gantt bar for Byggefase]																																																					
470	Oppstart byggeplass	100%	0 dager	ma 18.05.15	ma 18.05.15	[Gantt bar for Oppstart byggeplass]																																																					
471	Rigg av byggejerde	100%	3 ukr	ma 18.05.15	fr 05.06.15	[Gantt bar for Rigg av byggejerde]																																																					
472	Utgraving byggegrop	100%	7 ukr	ma 18.05.15	fr 03.07.15	[Gantt bar for Utgraving byggegrop]																																																					
473	Rigg av brakkerigg	0%	2 ukr	ma 27.07.15	fr 07.08.15	[Gantt bar for Rigg av brakkerigg]																																																					
474	<b>Trinn 1: Bygg 3 - Legevakt / Øyeblikkelig hjelp</b>	<b>0%</b>	<b>364 dager</b>	<b>ma 27.07.15</b>	<b>fr 20.01.17</b>	[Gantt bar for Trinn 1: Bygg 3 - Legevakt / Øyeblikkelig hjelp]																																																					
475	Graving for fundamenter	0%	2 ukr	ma 27.07.15	fr 07.08.15	[Gantt bar for Graving for fundamenter]																																																					
476	Betongarbeider fundament	0%	3 ukr	ma 10.08.15	fr 28.08.15	[Gantt bar for Betongarbeider fundament]																																																					
477	Ringjord	0%	2 dager	ma 17.08.15	ti 18.08.15	[Gantt bar for Ringjord]																																																					
478	Legging Uponorrør	0%	1 uk	ma 31.08.15	fr 04.09.15	[Gantt bar for Legging Uponorrør]																																																					
479	Legging bunnledninger	0%	4 dager	ma 07.09.15	to 10.09.15	[Gantt bar for Legging bunnledninger]																																																					
480	Legging trekkerør elektro	0%	3 dager	on 09.09.15	fr 11.09.15	[Gantt bar for Legging trekkerør elektro]																																																					
481	Gulv: Isolering	0%	2 ukr	ma 14.09.15	fr 25.09.15	[Gantt bar for Gulv: Isolering]																																																					
482	Legging bunnvarme	0%	4 dager	ma 28.09.15	to 01.10.15	[Gantt bar for Legging bunnvarme]																																																					
483	Gulv: Utstøping	0%	1 dag	fr 02.10.15	fr 02.10.15	[Gantt bar for Gulv: Utstøping]																																																					
484	Inntransport ventilasjonsaggregater	0%	0 dager	ma 05.10.15	ma 05.10.15	[Gantt bar for Inntransport ventilasjonsaggregater]																																																					
485	Bæresystem ( ca 3356m²)	0%	4 ukr	ma 05.10.15	fr 30.10.15	[Gantt bar for Bæresystem ( ca 3356m²)]																																																					
486	Tak (ca 1228m²)	0%	2 ukr	ma 02.11.15	fr 13.11.15	[Gantt bar for Tak (ca 1228m²)]																																																					
487	Yttervegg	0%	2 mndr	ma 16.11.15	on 13.01.16	[Gantt bar for Yttervegg]																																																					
488	Innervegg	0%	4 mndr	to 14.01.16	ma 09.05.16	[Gantt bar for Innervegg]																																																					
489	Teknisk installasjon	0%	10 mndr	ma 16.11.15	ma 19.09.16	[Gantt bar for Teknisk installasjon]																																																					
490	Maling, flis og belegg	0%	4 mndr	ti 10.05.16	ma 19.09.16	[Gantt bar for Maling, flis og belegg]																																																					
491	Innredning/fast inventar	0%	3 mndr	ti 20.09.16	ma 12.12.16	[Gantt bar for Innredning/fast inventar]																																																					
492	Innregulering tekniske fag	0%	4 ukr	ti 13.12.16	ma 16.01.17	[Gantt bar for Innregulering tekniske fag]																																																					
493	Utvask og mangelliste	0%	24 dager	ti 13.12.16	fr 20.01.17	[Gantt bar for Utvask og mangelliste]																																																					
494	Overlevering bygg til BH (20.01.2017)	0%	0 dager	fr 20.01.17	fr 20.01.17	[Gantt bar for Overlevering bygg til BH (20.01.2017)]																																																					
495	<b>Trinn 2: Bygg 2 - Gymsal, ambulanse, 110-sentral</b>	<b>0%</b>	<b>280 dager</b>	<b>ma 10.08.15</b>	<b>ma 03.10.16</b>	[Gantt bar for Trinn 2: Bygg 2 - Gymsal, ambulanse, 110-sentral]																																																					
496	Graving for fundamenter	0%	2 ukr	ma 10.08.15	fr 21.08.15	[Gantt bar for Graving for fundamenter]																																																					

# Hovedfremdriftsplan 20743 Brannstasjonen

utskrift: fr 10.07.15

