FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN NYTT RÅDHUS SANDNES KOMMUNE

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1	**PROGRAMERINGSFASEN**	**20 dager**	**ma 14.10.13**	**fr 08.11.13**
2	Utarbeidelse av romprogram	20 dager	ma 14.10.13	fr 08.11.13
3	**ARKITEKTKONKURRANSE**	**245 dager**	**ma 24.03.14**	**fr 27.02.15**
4	Forberedelser	100 dager	ma 24.03.14	fr 08.08.14
5	Produksjon av underlag	45 dager	ma 11.08.14	fr 10.10.14
6	Annonsering	10 dager	ma 29.09.14	fr 10.10.14
7	Konkurranseperiode ??	60 dager	ma 13.10.14	fr 02.01.15
8	"Publikumsperiode"	20 dager	ma 05.01.15	fr 30.01.15
9	Bedømming	20 dager	ma 05.01.15	fr 30.01.15
10	Kåring av vinner	5 dager	ma 02.02.15	fr 06.02.15
11	Valg av arkitekt	15 dager	ma 09.02.15	fr 27.02.15
12	Reguleringsplan Fase 2	200 dager	ma 30.03.15	fr 01.01.16
13	**SKISSE-/FORPROSJEKT**	**265 dager**	**ti 28.04.15**	**ma 02.05.16**
14	Vedtak bystyret	0 dager	ti 28.04.15	ti 28.04.15
15	Arkitekttegninger	180 dager	ti 28.04.15	ma 04.01.16
16	Engasjement tekniske konsulenter	20 dager	ti 26.05.15	ma 22.06.15
17	Tekniske fag	120 dager	ti 21.07.15	ma 04.01.16
18	Kalkyler	15 dager	ti 05.01.16	ma 25.01.16
19	Vedtak byggherren	0 dager	ma 25.01.16	ma 25.01.16
20	Anbudsmateriell	70 dager	ti 26.01.16	ma 02.05.16
21	**ANBUDSFASE**	**130 dager**	**ti 26.01.16**	**ma 25.07.16**
22	Rammesøknad	60 dager	ti 26.01.16	ma 18.04.16
23	Anbudsfasen	30 dager	ti 03.05.16	ma 13.06.16
24	Innstilling	10 dager	ti 14.06.16	ma 27.06.16
25	Vedtak byggherren	0 dager	ma 27.06.16	ma 27.06.16
26	Kontrakt	20 dager	ti 28.06.16	ma 25.07.16
27	**PRODUKSJON**	**612 dager**	**ti 26.07.16**	**on 28.11.18**
28	Arbeidstegninger	300 dager	ti 26.07.16	ma 18.09.17
29	IG-Søknad	20 dager	ti 15.11.16	ma 12.12.16
30	Bygging	450 dager	ti 13.12.16	ma 03.09.18
31	Ferdigstilling/prøvedrift	42 dager	ti 04.09.18	on 31.10.18
32	Innflytting	20 dager	to 01.11.18	on 28.11.18

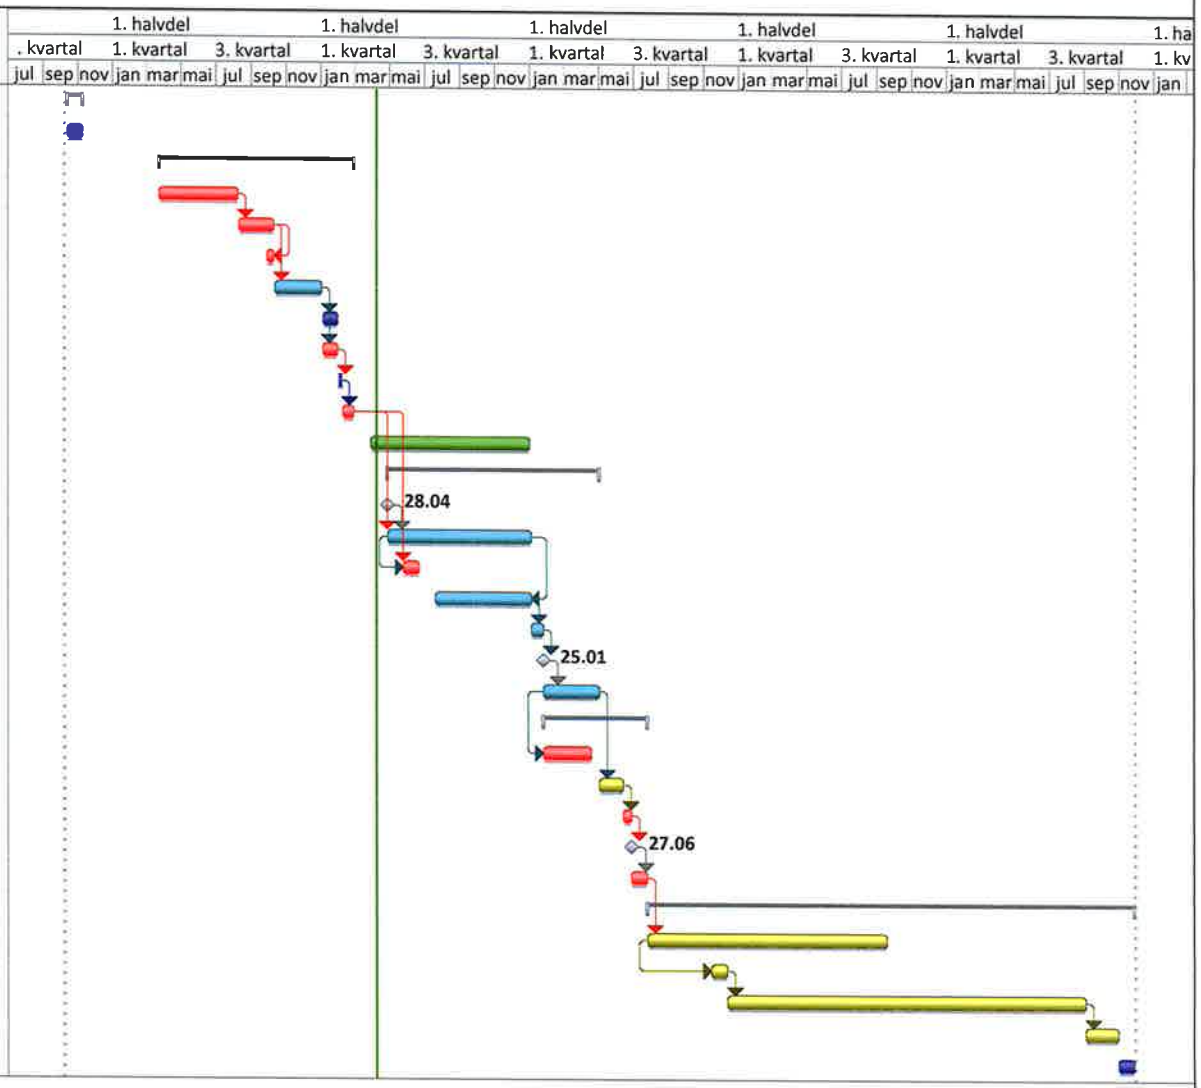

Prosjekt: 777fp009.515_2007vers
Dato: ti 07.04.15

Aktivitet		Sammendrag		Ekstern milepæl	
Deling		Prosjektsammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Eksterne aktiviteter		Fremdrift	
